新たに始まる工事の紹介

上今井遊水地内の斜面対策を実 施する工事が新たに始まります。 施工業者、現場代理人をご紹介し ます。

今後、工事の開始時期や進捗状 況については、遊水地だよりにて、 随時、お知らせしていきますので、 よろしくお願いします。

上今井遊水地斜面対策その1工事

受注者:中野土建(株)

工 期: 令和6年10月17日 ~令和7年3月31日(※)

現場代理人:神田 惇平



※工期については、延長となる可能性があります。



なお、千曲川上今井遊水地排水樋門工事(受注者:北野建設(株))、上今井 遊水地囲繞堤工事(受注者: (株)植木組)、上今井左岸築堤その1~3工事 (受注者(株)守谷商会、(株) 鹿熊組、(株) 北條組) については、引き続き鋭意施 工を進めております。

お問合せ先

- ●事業全般に関すること 千曲川緊急治水対策出張所
- ●用地補償に関すること 千曲川河川事務所 用地第一課 用地補償(上今井区前島·栗林区) 用地第三課
- ●工事に関すること 中野出張所 建設監督官

電話 0269-67-0450 電話 026-227-7613 電話 026-227-0480

電話 0269-22-2729

令和6年11月号(No.27) 国土交通省北陸地方整備局 千曲川河川事務所

上今井遊水地整備の地元区向け現場見学会を開催しました

上今井遊水地整備について、地域の皆様に整備内容や整備状況等をよりご理解いただけ るよう、下記の日程で現場見学会を開催させていただきました。

当日はそれまでとは打って変わって肌寒い天 候となりましたが、午前の部・午後の部合計で 23名の方にご参加いただき、普段はなかなか 見ていただけない排水樋門工事現場も間近で見 学していただきました。ご参加いただいた皆様、 ありがとうございました。

なお、今後は親子連れの方や女性の方々にも 気軽にご参加いただけるような企画も検討して まいりますので、引き続き遊水地整備へのご理 解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。



<現場見学会概要>

- ■開催日時 令和6年10月20日(日)午前の部 10:00~11:00 午後の部 13:30~14:30
- ■開催場所 上今井遊水地事業用地内(排水樋門工事現場など)
- 上今井区・大俣区・栗林区の皆様 午前の部11名、午後の部12名 計23名 ■参加者
- (1) 上今井遊水地整備・左岸埋立てについての概要
 - (2) 工事の実施状況





北大原地先の事業用地境界部分へ境界ロープを設置しました

北大原地先の事業用地と民 地の境界部分(右図赤線カ 所)について、接道等で区切 られておらず境界が不明瞭と なっていたことから、先日の 地権者様立ち会いの内容に基 づいて、10月28日に境界 ロープを設置させていただき ました。

関係者の皆様におかれまし てはご理解をよろしくお願い いたします。





個別訪問による用地補償内容説明・ご契約について

本年8月に土地調書・物件調書の確認にご協力いただいた県道三水中野線沿い及び栗林 区堤防前面の地権者様に対する、補償内容の 説明および契約の準備が整いました。

つきましては、11月上旬から個別に訪問の上、補償内容説明・ご契約の締結を進めさせていただく予定です。該当する方へは、用地担当者から別途連絡を差し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

上今井左岸地区埋立てに 関するお知らせ

本年9月に実施した左岸地区埋立てに伴う土地調書・物件調書確認会では、地権者の皆様にご協力いただき誠にありがとうございました。今後は補償内容説明の準備が整い次第ご案内させていただき、12月頃に契約調印会を実施する予定でおります。

なお、物件調書で確認いただいた立木の 伐採等につきましては、ご契約後に手配い ただきますようお願い申し上げます。

上今井左岸築堤工事 進捗状況

(株)守谷商会、(株) 鹿熊組、(株) 北條組



築堤盛土工事で活躍するICT技術搭載機械の紹介-2




転圧管理システムモニター表示(締固め回数により塗りつぶし色変化)



【GPSを用いた転圧管理システム】とは、従来転圧作業後作業量に応じて既定の締固め状況を点で管理していましたが、GPSの位置情報よりリアルタイムに締固め状況が確認できます(走行軌跡・転圧回数)。

これにより作業の効率化・ 転圧不足が排除され品質向 上に繋がります。また、施 工面全体での管理が可能と なり、私たちの現場管理業 務も簡素化され、大活躍し ています!




上今井遊水地囲繞堤工事 進捗状況

(株) 植木組

9月より進めていました護岸部の法面ブロックの施工が完了しました(右下写真参照) 現在、囲繞堤本体工の二次盛土の施工を行っています。二次盛土の施工は11月中旬に完 了予定です。また、外周工事用道路の施工につきましては路床改良が完了し、舗装道路 の基礎となる下層路盤の施工中です。

安全第一で作業を進めていきますので、ご協力をお願いいたします。

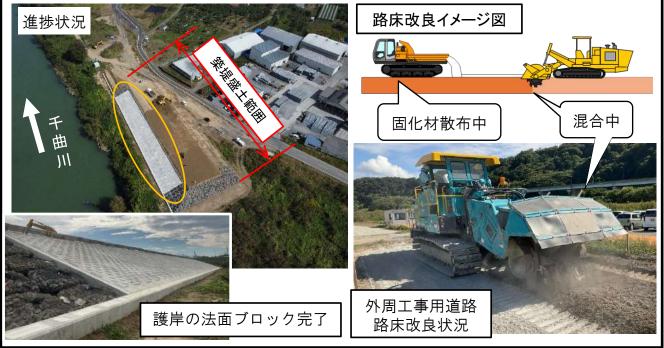

上今井遊水地排水樋門工事 進捗状況

北野建設(株)

堤防の下に埋まる樋門本体部分の構造物は、10月完了しました。(ゲート部分を除く)

11月以降は、遊水地側の構造物を引き続き施工していきます。また、川側の構造物施工箇所の掘削も行っていきます。

引き続き、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力をお願い致します。

右写真 : 遊水地側上空から見た現場全景です。

右下写真:樋門本体ゲート部分です。

下 図 : 今回施工の構造物3Dモデルです。 現在、遊水地側の川裏翼壁を施工して

います。11月から、千曲川側の川表 翼壁部分の掘削を行ないます。

