

- 日 時:令和7年10月19日(日) 午前10時00分～12時00分
- 場 所:上今井公民館2階
- 出席者:32名

【説明会 概要】

<主催>

千曲川河川事務所
千曲川緊急治水対策出張所

<内容>

1. 信濃川水系緊急治水対策プロジェクト（上今井遊水地）これまでの動き、事業期間の変更について
2. 現在までの工事進捗状況、今後の工事予定について
3. 上今井左岸埋め立て予定地における基盤整備工事（新規発注工事）の工事内容について


【千曲川河川事務所からの主な説明】

- これまでの各段階で実際に要した期間や進捗状況、工事に要する期間について検討の結果、上今井遊水地の事業期間、事業完了時期（遊水地の効果発揮時期）は当初計画の令和9年度末から令和13年度出水期前（令和13年5月末）に変更する必要が生じた。
- 令和7年10月現在、排水樋門、遊水地の堤防（囲繞堤、周囲堤）整備、遊水地内掘削と土砂改良、掘削に伴う斜面对策、埋蔵文化財調査を行っており、左岸では堤防整備を行っている。令和8年度より右岸では遊水地へ洪水を流入させるための越流堤（可動堰）、左岸では埋め立て工事に本格着手する。令和9年度末までに、遊水地の堤防、遊水地内の一部掘削を完了させることで、遊水地の一部運用開始を目指す。
- 令和7年10月以降、上今井遊水地左岸の埋め立て盛土の本格実施に先立ち、埋め立て盛土を行う範囲の一部で、表土の掘削、既設の用水路の撤去等の基盤整備工事に着手していく。



地元説明会の様子

上今井遊水地 これまでの動きと今後の工程(令和7年10月見直し)

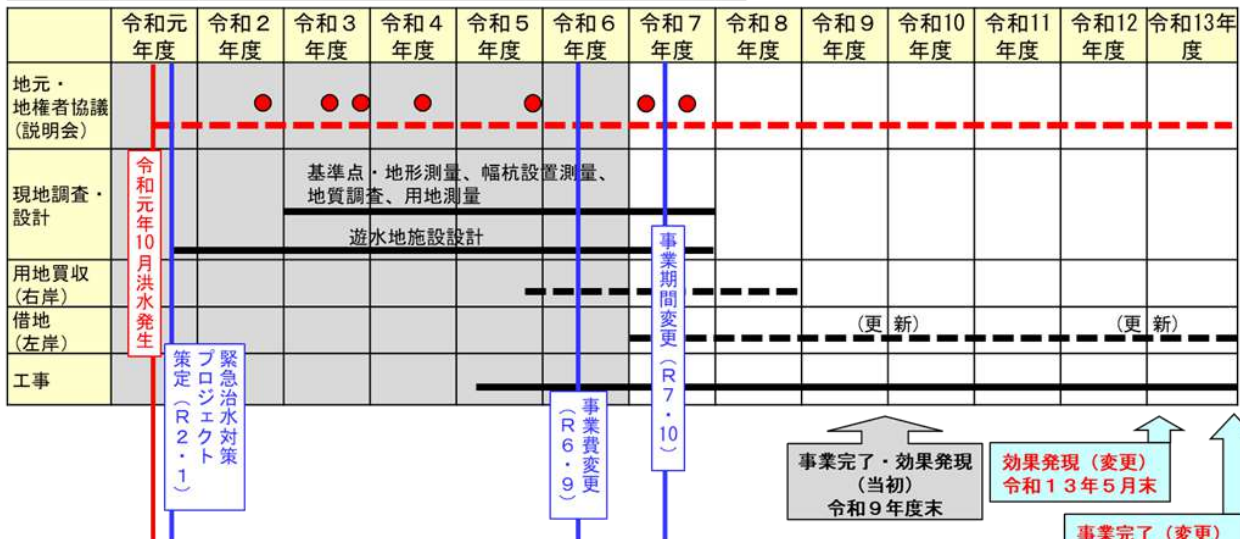

※上記は令和7年10月時点の工程であり、今後現地状況や地元調整状況、その他不測の状況が生じた場合、工程の変更を検討する可能性があります。
