



開催報告

中野市立高丘小4年生の皆様を対象に 上今井遊水地整備の出前授業・工事現場見学会を実施しました

10月14、16日の2日間に渡って、高丘小4年生の皆様を対象に、排水樋門工事施工業者（北野建設(株)）との共催で上今井遊水地整備の出前授業・工事現場見学会を開催しました。



10/14 出前授業の様子



10/16 排水樋門工事現場見学

出前授業では児童向けパンフレット『なるほど!!上今井遊水地』を活用しながら、「遊水地に貯めることができる水の量は東京ドーム何個分?」など、遊水地の役割や整備内容等について学習しました。また現場見学では、工事中の排水樋門を間近で見て、その大きさに驚いている様子でした。

児童の皆様からは、「遊水地の大切さがよくわかった。早く完成させて地域を守ってほしい」など、大変ありがたいコメントを多数いただきました。

ご案内

上今井遊水地 工事現場見学会 および 南大原遺跡 舞台地区 現地説明会 の開催について

令和7年11月15日(土)、千曲川河川事務所と長野県埋蔵文化財センターでは、**上今井遊水地周辺の3区(上今井並びに大俣並びに栗林)の皆様方を対象に**、上今井遊水地工事現場見学会および南大原遺跡舞台地区現地説明会を開催します。
(午前の部10~12時、午後の部13~15時の2回開催)

工事現場見学については、「上今井遊水地だより令和7年9月号」でご紹介した、堤防盛土材に使用する土砂をブレンドするための土砂改良ヤードを、発掘調査については、平安時代の集落の存在が明らかとなった舞台地区の竪穴建物跡や出土した遺物等をそれぞれ見学いただけます。

開催内容の詳細については、別途回覧させていただいたお知らせチラシをご覧ください。



午前の部10時、または午後の部13時の各開始時間までに右図の受付集合場所へお集まりください。(内容は2回とも同一です)



埋蔵文化財発掘現場

土砂改良ヤード


お知らせ

新たに始まる工事の紹介

上今井遊水地の新たな工事として左岸側の基盤整備(表土掘削・盛土整地)や用水路撤去等を行う「上今井左岸基盤整備他工事」が始まります。工事の施工業者、現場代理人をご紹介します。

工事期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解をいただけますようお願い致します。

上今井左岸基盤整備他工事
 受注者：中野土建(株)
 工期：令和7年10月17日
 ~令和8年3月31日(※)
 現場代理人：渡邊 拓斗
 【別ページ工事進捗状況の⑦の工事】



※工期については、今後の現地状況等により延長となる可能性があります。

お問合せ先

- 事業全般に関すること 千曲川緊急治水対策出張所 電話 0269-67-0450
- 用地補償に関すること 千曲川河川事務所 用地第一課 電話 026-227-7613
- 工事に関すること 中野出張所 電話 0269-22-2729

ご報告

上今井遊水地整備の事業期間の変更について

令和7年10月2日に、国、県、流域の市町村長等が会した「信濃川水系(信濃川上流)流域治水協議会」が開催され、国、県より上今井遊水地整備を含む「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の事業期間の変更についてご説明しました。

これまでの各段階で実際に要した期間や進捗状況、今後の工事に要する期間について精査した結果、**上今井遊水地の事業は、当初計画の令和9年度から令和13年度に完了時期を変更する必要が生じました。**なお治水効果の早期発現のため、**令和9年度末までに堤防の整備を完了し、遊水地の一部運用開始を目指します。**

今後とも遊水地の整備を安全かつ着実に進め、関係機関等と連携して1日も早い遊水地の完成を目指してまいりますので、引き続き皆様方のご理解、ご協力をお願いいたします。

上今井遊水地 これまでの動きと今後の工程(令和7年10月見直し)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
地元・地権者協議(説明会)													
現地調査・設計			基準点・地形測量、幅杭設置測量、地質調査、用地測量										
用地買収(右岸)													
借地(左岸)									(更新)			(更新)	
工事													

緊急治水対策プロジェクト(R2・1) | 事業期間変更(R7・10) | 事業費変更(R6・9)

事業完了・効果発現(当初) 令和9年度末 | 効果発現(変更) 令和13年5月末 | 事業完了(変更) 令和13年度末

※上記は令和7年10月時点の工程であり、今後現地状況や地元調整状況、その他不測の状況が生じた場合、工程の変更を検討する可能性があります。

上今井遊水地整備地元説明会 開催報告

遊水地整備の事業期間の変更等について、令和7年10月19日(日)、上今井区民および左岸埋立て地の地権者・耕作者の皆様方を対象に、「上今井遊水地整備地元説明会」を開催し、下記事項についてご説明いたしました。(会場：上今井公民館2階大広間)

- ①事業説明…事業期間の変更、現在までの工事進捗状況、今後の工事予定について
- ②工事説明…上今井左岸埋め立て予定地における基盤整備工事(新規発注工事)について

参加された方々より、早期の堤防整備、内水対策の実施に関する要望や、現在借地させていただいている左岸埋立て予定地の返地時期等、多くのご意見、ご質問をいただきました。

なお、大俣区並びに栗林区の皆様方におかれましては、区長様へご相談の結果、別途、上今井遊水地整備の事業期間の変更等に関する説明資料を回覧させていただいておりますので、ぜひご覧ください。



説明会の様子

① 千曲川上今井遊水地排水樋門工事：北野建設(株)
千曲川上今井遊水地他ゲート製作・据付工事：飯田鉄工(株)

樋門本體工
ゲート据付
川裏翼壁工
川表翼壁工

11月以降、引き続き川側構造物(翼壁)の躯体工事を進めていきます。ゲート据付工事では11月に扉体の据付を行います。

② 上今井遊水地斜面对策その1工事：中野土建(株)
上今井遊水地斜面对策その2工事：藤森建設工業(株)


千曲川
古川
斜面对策その1
斜面对策その2

11月以降、引き続き地盤改良工事を進めていきます。地盤改良工完了後に補強盛土工を開始します。

③ 上今井遊水地池内掘削その1他工事：(株)加賀田組
上今井遊水地池内掘削その2他工事：飯島建設(株)
上今井遊水地池内掘削その3他工事：(株)植木組

大俣地区
古川
池内掘削その1掘削箇所
池内掘削その2掘削箇所
池内掘削その3掘削予定箇所
土砂改良ヤード①

11月以降、引き続き3工事により遊水地内の掘削、土砂の改良を進めていきます。

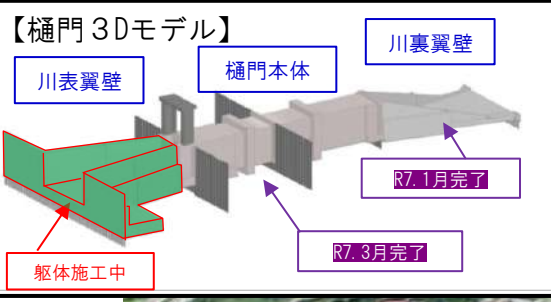

⑦ 上今井左岸基盤整備他工事：中野土建(株)

千曲川
上今井橋
上今井地区

11月以降、左岸の埋立て盛土に先立っての表土の掘削、既存水路の撤去等に着手します。

④ 上今井左岸築堤その4他工事：(株)北條組

盛土箇所
千曲川

11月以降、引き続き土砂改良ヤード②にて改良された土砂を用いて盛土工事を行っていきます。

⑤ 上今井遊水地囲繞堤その2他工事：(株)鹿熊組
上今井遊水地囲繞堤その3他工事：(株)北條組

千曲川
上今井橋
県道三水中野線
囲繞堤その2
囲繞堤その3

10月は囲繞堤の下に配管されている畑かんの切回し工事を行いました。11月上旬には畑かんの連絡工事をを行う予定です。

10月下旬より県道三水中野線の盛土工事を行っており、11月以降、ブロック張り等の構造物工事も行っています。

⑥ 上今井遊水地周囲堤その1他工事：(株)フガワコーポレーション
上今井遊水地周囲堤その2他工事：中信建設(株)

周囲堤その2
周囲堤その1
県道三水中野線
栗林堤防

起工測量の準備として、施工ヤードの伐開作業を行っています。

11月以降も引き続き盛土工事を進めていきます。また、堤脚水路についても工事を開始しました。
