

平和橋遊水地の整備について

令和８年５月２６日
国土交通省千曲川河川事務所
千 曲 市

信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける遊水地整備（千曲川大臣管理区間）


（令和8年5月 時点）

- 令和元年東日本台風による洪水を踏まえた信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおいて、千曲川の国土交通大臣管理区間では5箇所の遊水地の整備を行います。
- 令和8年4月時点で上今井、埴生、塩崎遊水地の工事を実施中です。また、蓮、平和橋の両遊水地については、令和8年度より工事に着手予定です。




「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進

- 【第一段階】 令和元年東日本台風による災害復旧について令和3年度までに完了
- 【第二段階】 改良復旧である堤防強化(粘り強い河川堤防構造など)や大町ダム等再編事業(容量再編)を完了
並びに一部遊水地の運用を開始することで、一定の効果を発現
- 【第三段階】 遊水地、河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を令和13年度までに完了
なお、緊急治水対策プロジェクトで目標とする効果は令和13年出水期前までに発現

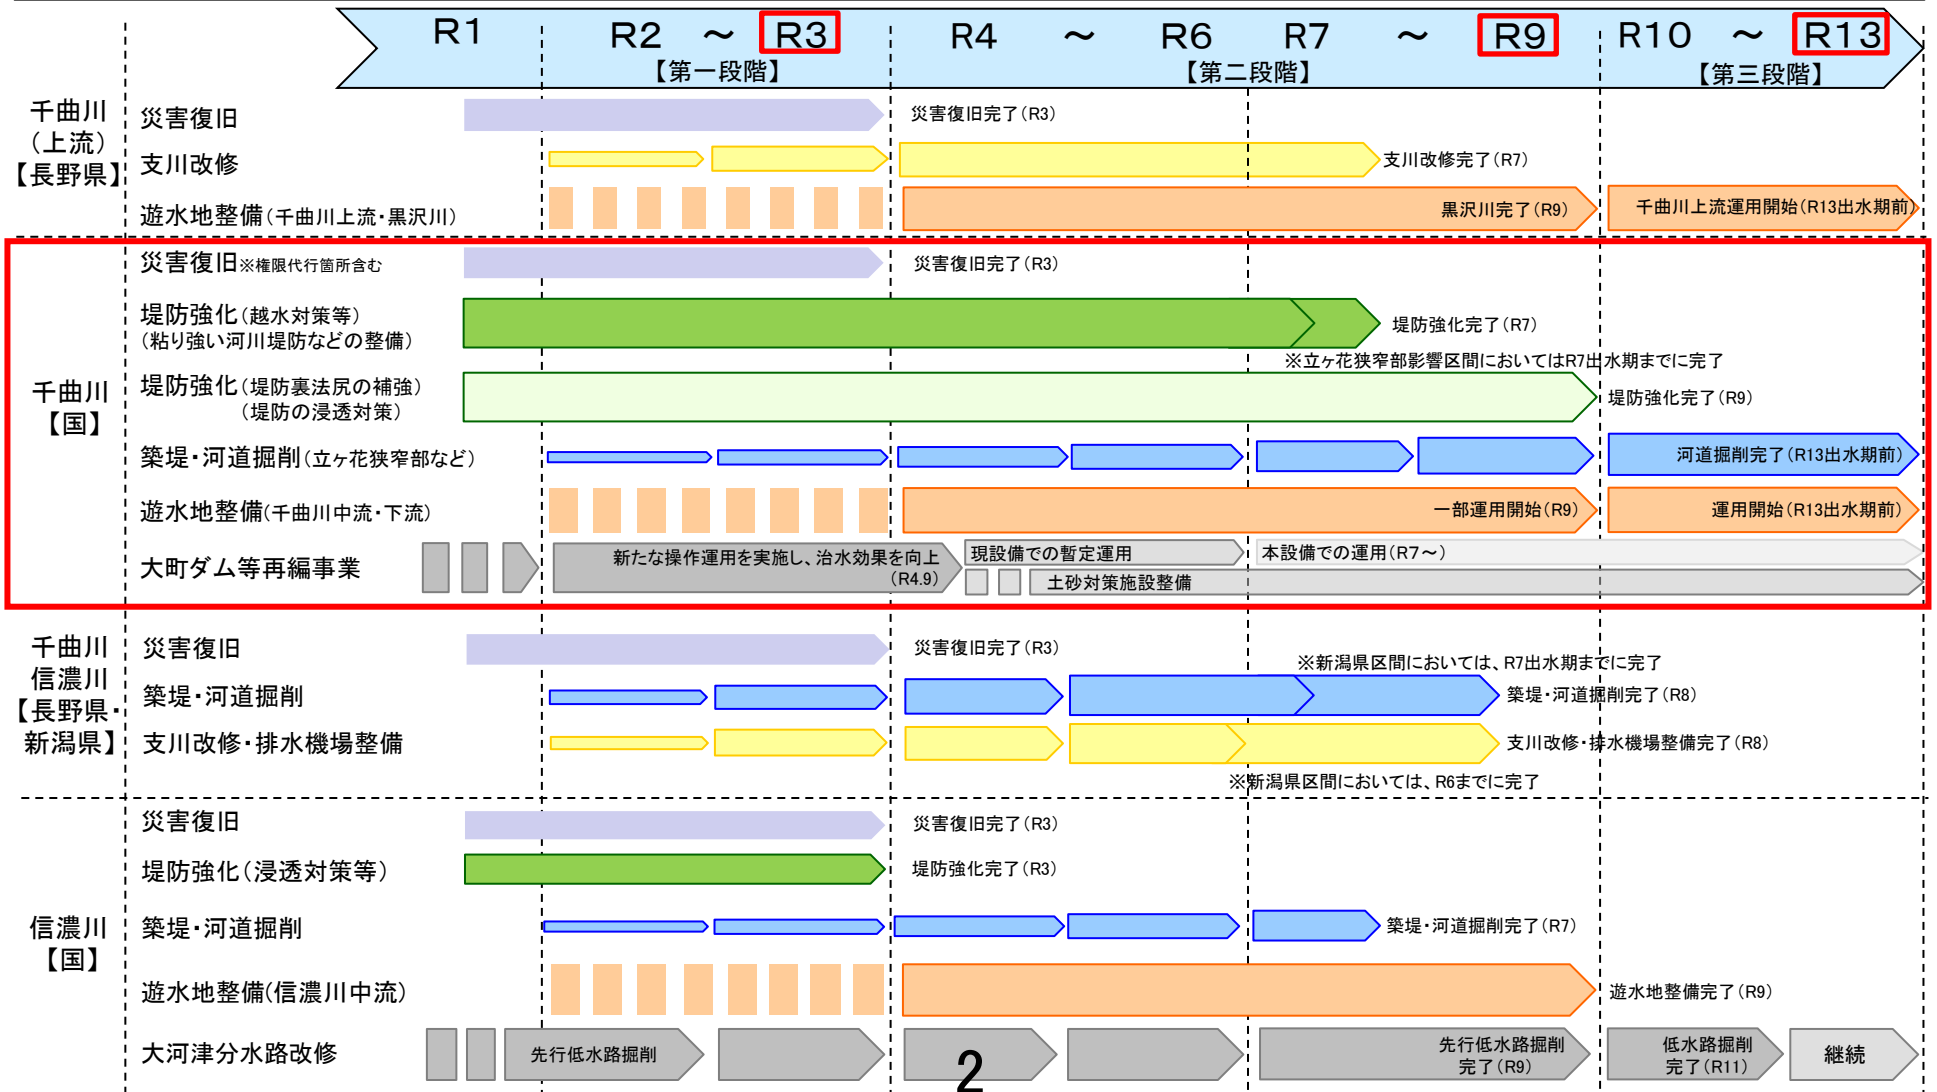

- 平和橋遊水地ではこれまで、地元・地権者の皆様への事業計画のご説明と協議、測量等の現地調査、遊水地施設の設計、用地買収の各段階で、地元の皆様方と調整を行いながら実施してきました。
- 令和6～7年度に、現時点までの進捗状況、遊水地全体の工事量を踏まえ、施工方法、施工計画の検討を行いました。
- これまでの各段階で実際に要した期間や進捗状況、工事に要する期間について検討の結果、平和橋遊水地の事業期間、事業完了時期（遊水地の効果発揮時期）は当初計画の令和9年度末から令和10年度末に変更する必要が生じました。
- 地元の皆様方のご理解、ご協力をいただきながら、用地買収、工事を安全かつ着実に進め、1日も早い遊水地の完成を目指してまいります。

平和橋遊水地 これまでの動きと今後の工程(令和7年10月見直し)

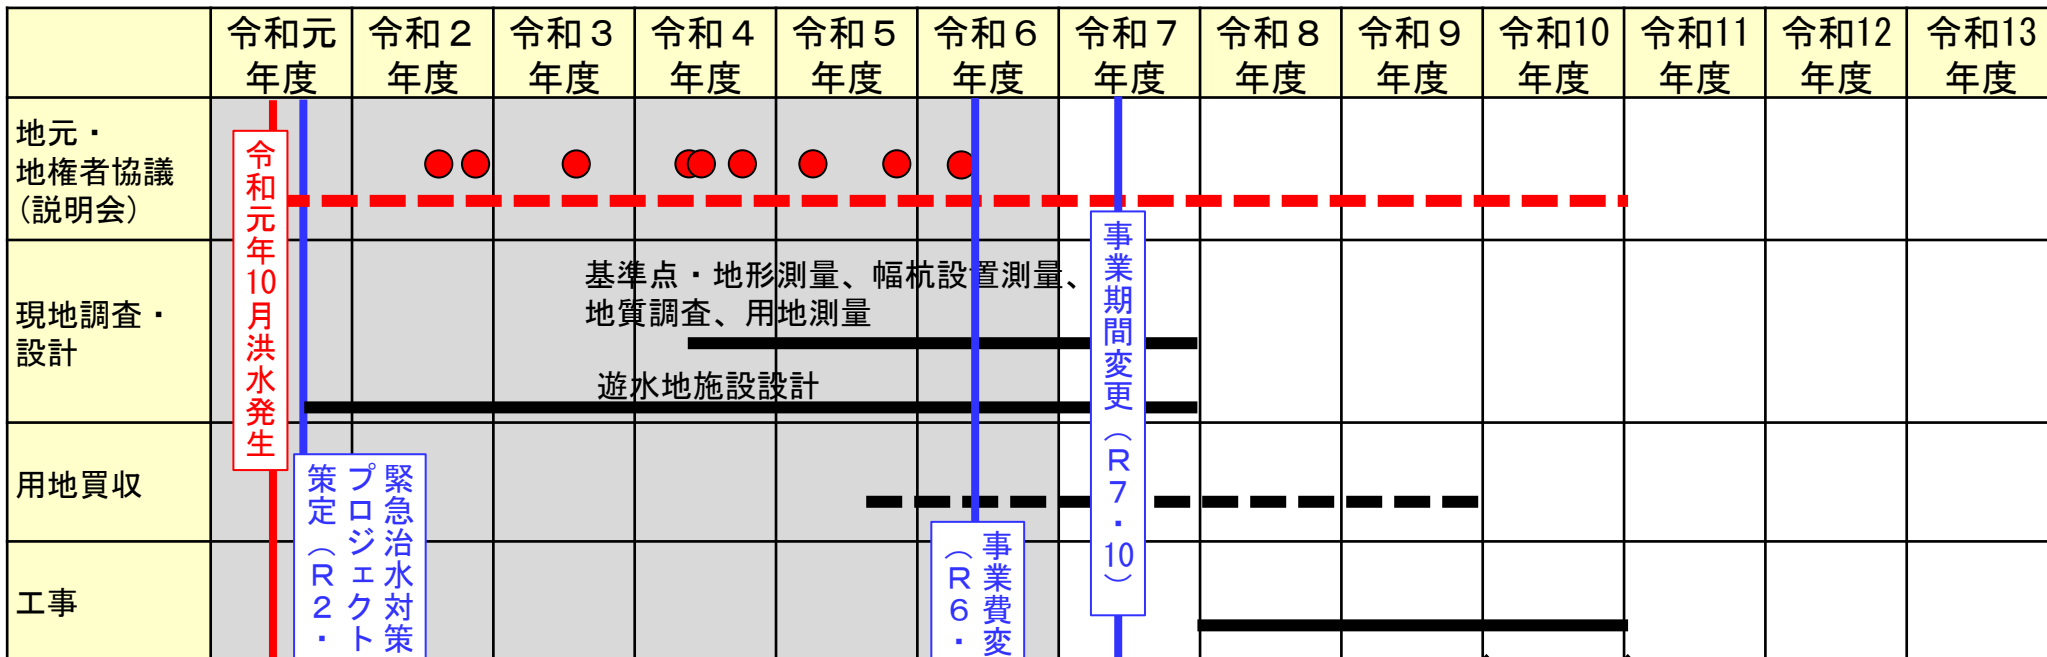

令和元年10月洪水発生

緊急治水対策プロジェクト (R2・1)

事業費変更 (R6・9)

事業期間変更 (R7・10)

完成目標 (当初)
令和9年度末

完成目標 (変更)
令和10年度末

※上記は令和7年12月時点の工程であり、今後現地状況や地元調整状況、その他不測の状況が生じた場合、工程の変更を検討する可能性があります。

平和橋遊水地の整備 令和8年度の工事予定

- 平和橋遊水地の工事は、排水樋門、遊水地の堤防（囲繞堤、周囲堤）工事に着手し、堤防の整備状況を踏まえ、洪水を遊水地へ流入させるための越流堤の工事を行います。
- 令和8年度は、遊水地の堤防（周囲堤）の一部と排水樋門の工事に着手し、遊水地の早期完成を目指してまいります。



平和橋遊水地整備 工事工程（令和8年5月時点）

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
排水樋門・堤外水路		■	■		
堤防（囲繞堤、周囲堤） 遊水地内掘削		■	■	■	
越流堤				■	

平和橋遊水地の整備 既存水路の取り扱いについて

- 周囲堤等の工事実施期間中、代団地内から遊水地事業用地を經由して若宮用水へ至る既存水路は、仮設水路等により排水機能を確保します。

