


信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

令和4年2月9日

北陸地方整備局 千曲川河川事務所
長野県 河川課





○令和3年度は、引き続き上下流バランスを踏まえた、全川での河道掘削等の改良復旧、ため池・田んぼダム等既存施設の有効利用（流域対策）、マイタイムラインの普及（ソフト施策）を実施

令和元年東日本台風（台風第19号）洪水における
・千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止
対策内容 河道掘削、遊水地、堤防整備・強化

- ・ため池等既存施設の補強や有効活用
- ・田んぼダムを活用した雨水貯留機能の確保
- ・学校グラウンドなどを活用した雨水貯留施設
- ・排水機場等の整備、耐水化の取組
- ・防災拠点等

- ・「まちづくり」や住まい方の誘導による水害に強い地域づくりの検討
- ・高床式住まいの推進
- ・マイ・タイムラインの普及
- ・公共交通機関との洪水情報の共有
- ・住民への情報伝達手段の強化




※計数については、今後の調査、検討等の結果、変更となる場合がある。

上下流や本川支川の信濃川流域全体を見据え、

- 立ヶ花狭窄部上流の緊急的な堤防強化（粘り強い河川堤防構造）
- 下流から計画的に行う堤防整備や河道掘削（大河津分水路改修、立ヶ花狭窄部掘削）
- 上流で洪水を貯留するダム（大町ダム等再編）や遊水地の整備

といった河川におけるハード対策をフル動員し、各管理者が連携・調整しながら、段階的かつ緊急的に対策を講じる。



立ヶ花狭窄部掘削



堤防強化(粘り強い河川堤防)



大町ダム等再編事業

黒沢川遊水地

千曲川上流遊水地



大河津分水路改修事業



信濃川中流遊水地群




千曲川下流遊水地群



千曲川中流遊水地群


凡 例	
	流域界
	県境
	河川
	既設ダム(直轄)
	基準地点(高水)
	基準地点(低水)
	主要地点
	想定氾濫区域(国管理区間)
	大臣管理区間

- 【第一段階(復旧)】 災害復旧を令和3年度までに完了(国(権限代行含む)は令和3年出水期まで、県は令和3年度)。並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を順次実施
- 【第二段階(復興)】 改良復旧である堤防強化(粘り強い河川堤防構造など)や遊水地、大町ダム等再編事業(容量再編)を完了
- 【第三段階(復興)】 遊水地、河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を令和9年度完了

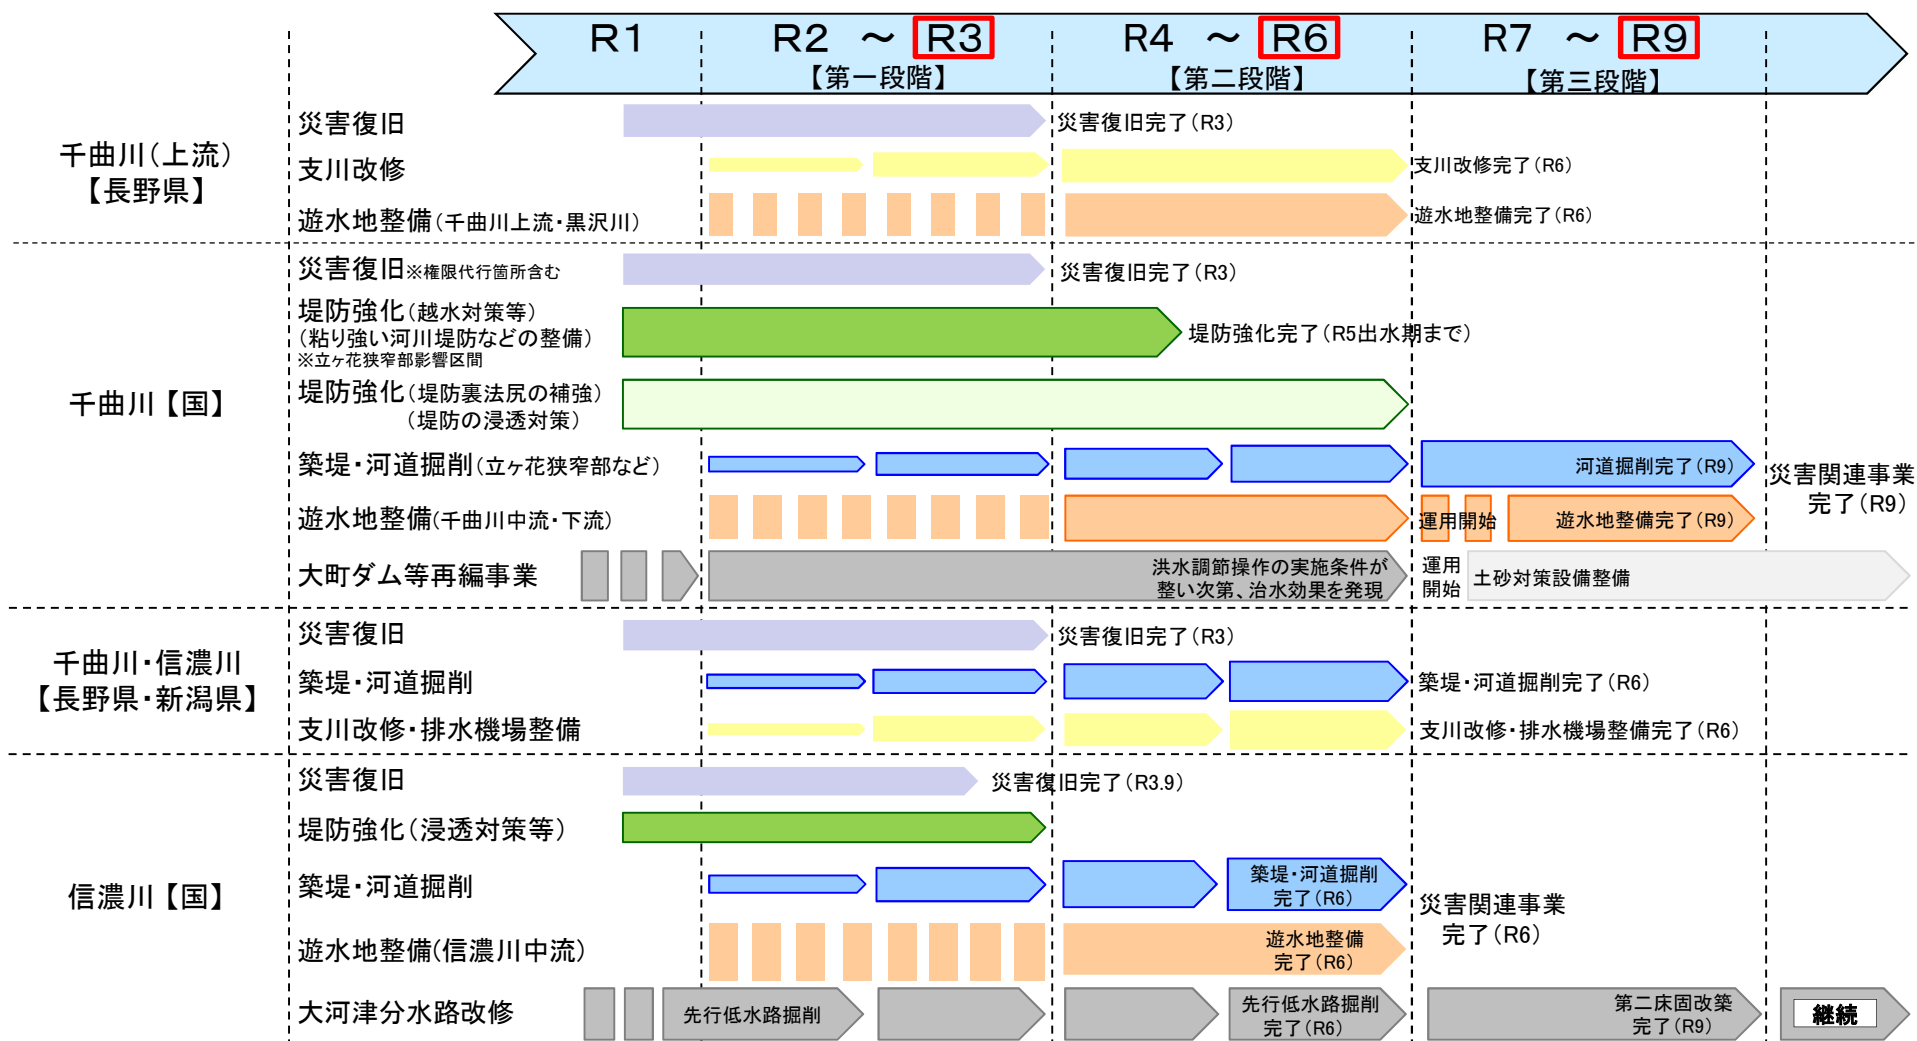


◇原型復旧は、全812箇所中692箇所完成（進捗率：85%）で令和3年度中に全箇所完成予定


◇改良復旧は、狭窄部の掘削及びその上流の堤防（左右岸約18km）堤防強化を推進中
◇遊水地（8箇所）は関係者（地元）説明会を開催、丁寧な説明を行いつつ早期の着手を目指している。

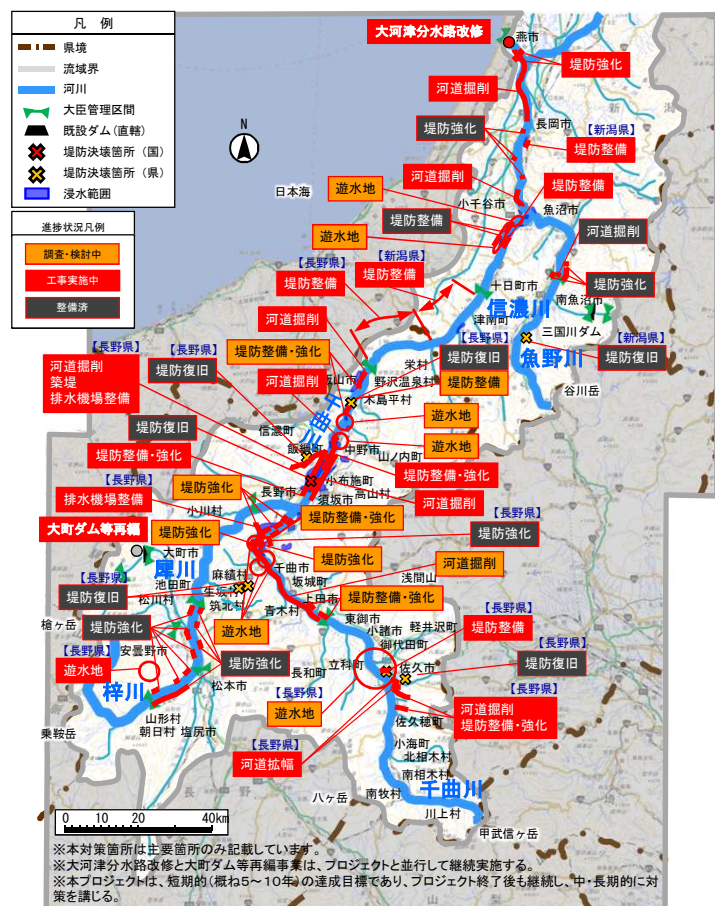


原型復旧の進捗





改良復旧等の進捗

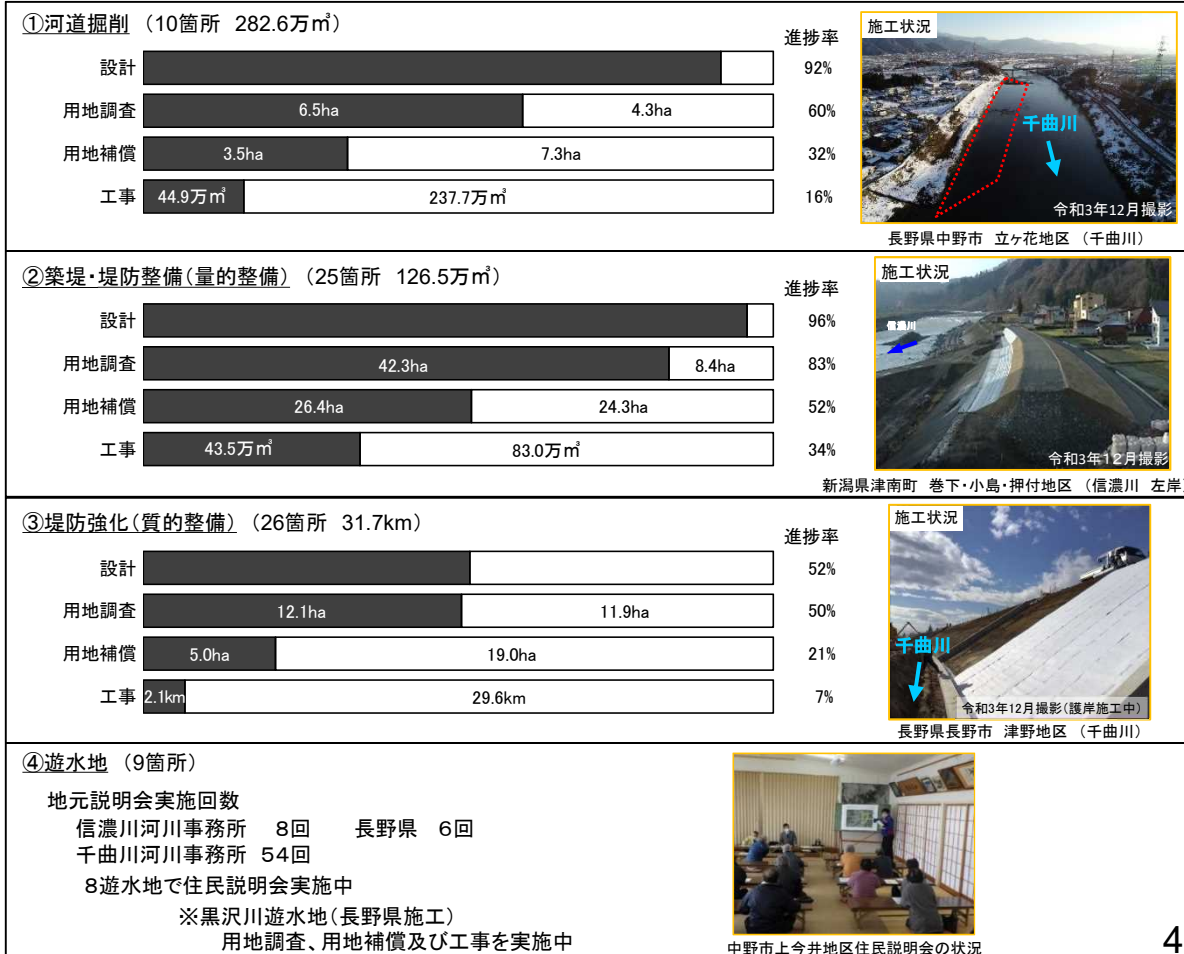



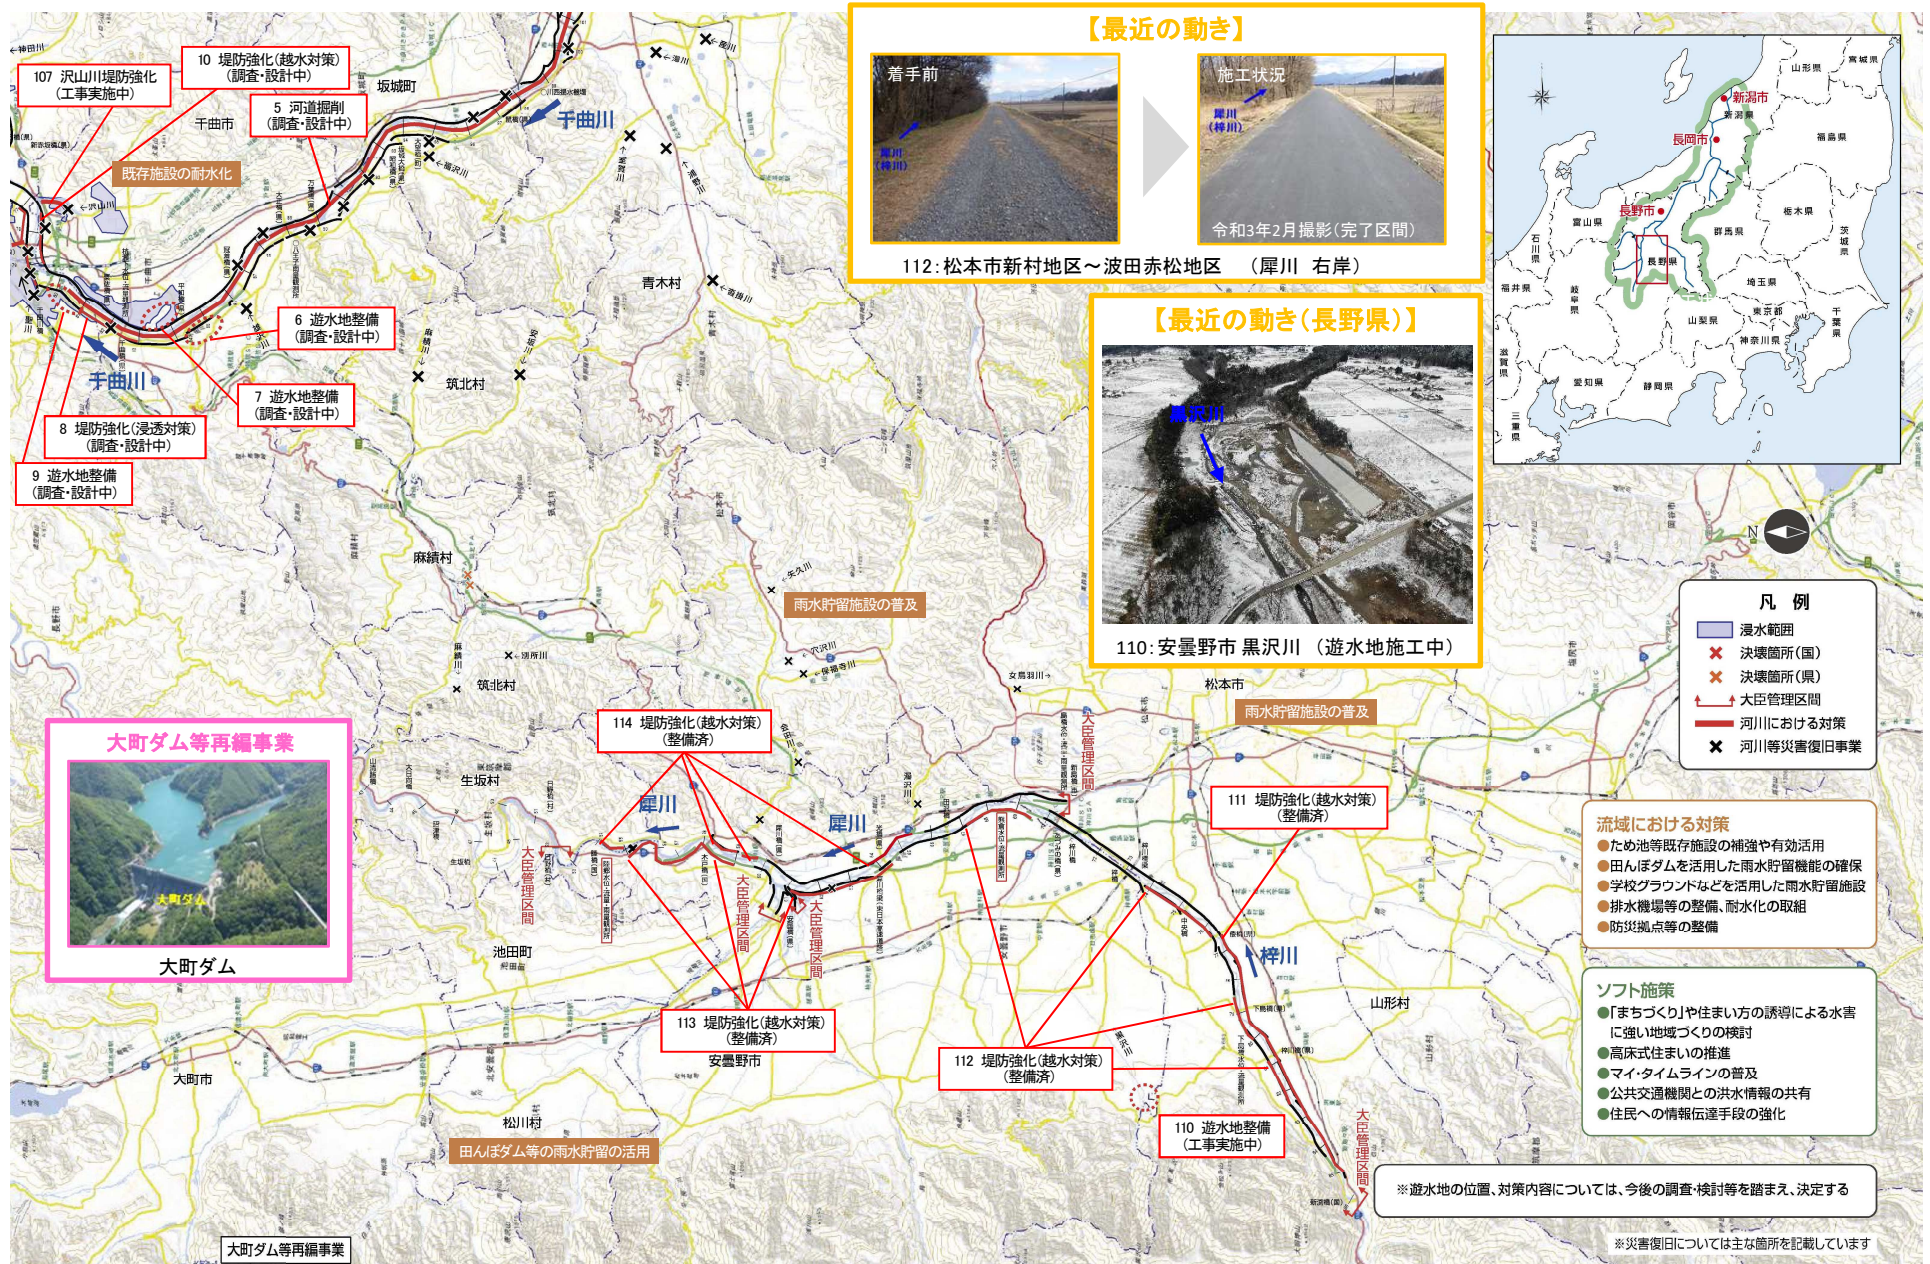

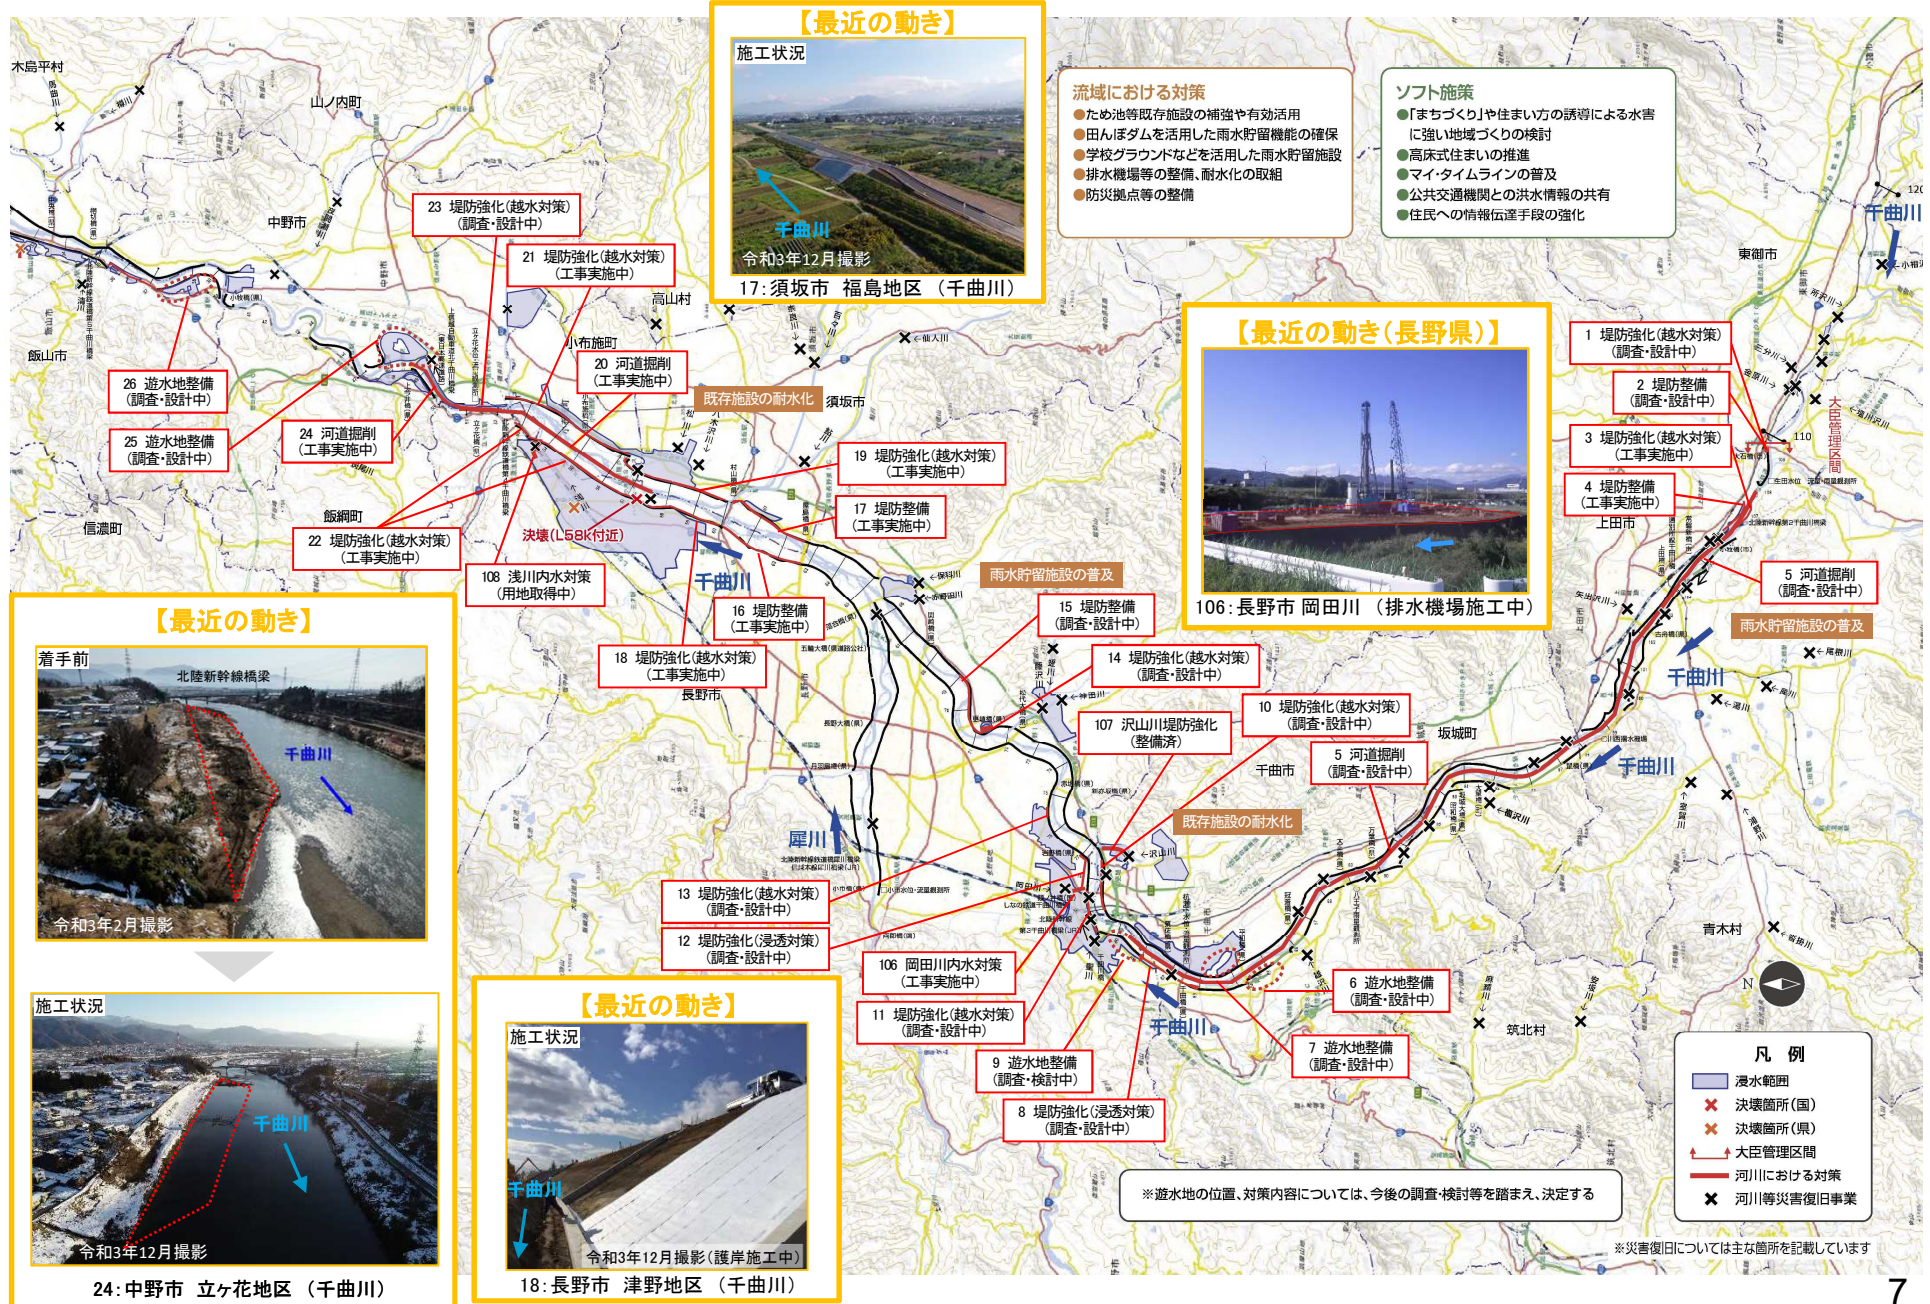

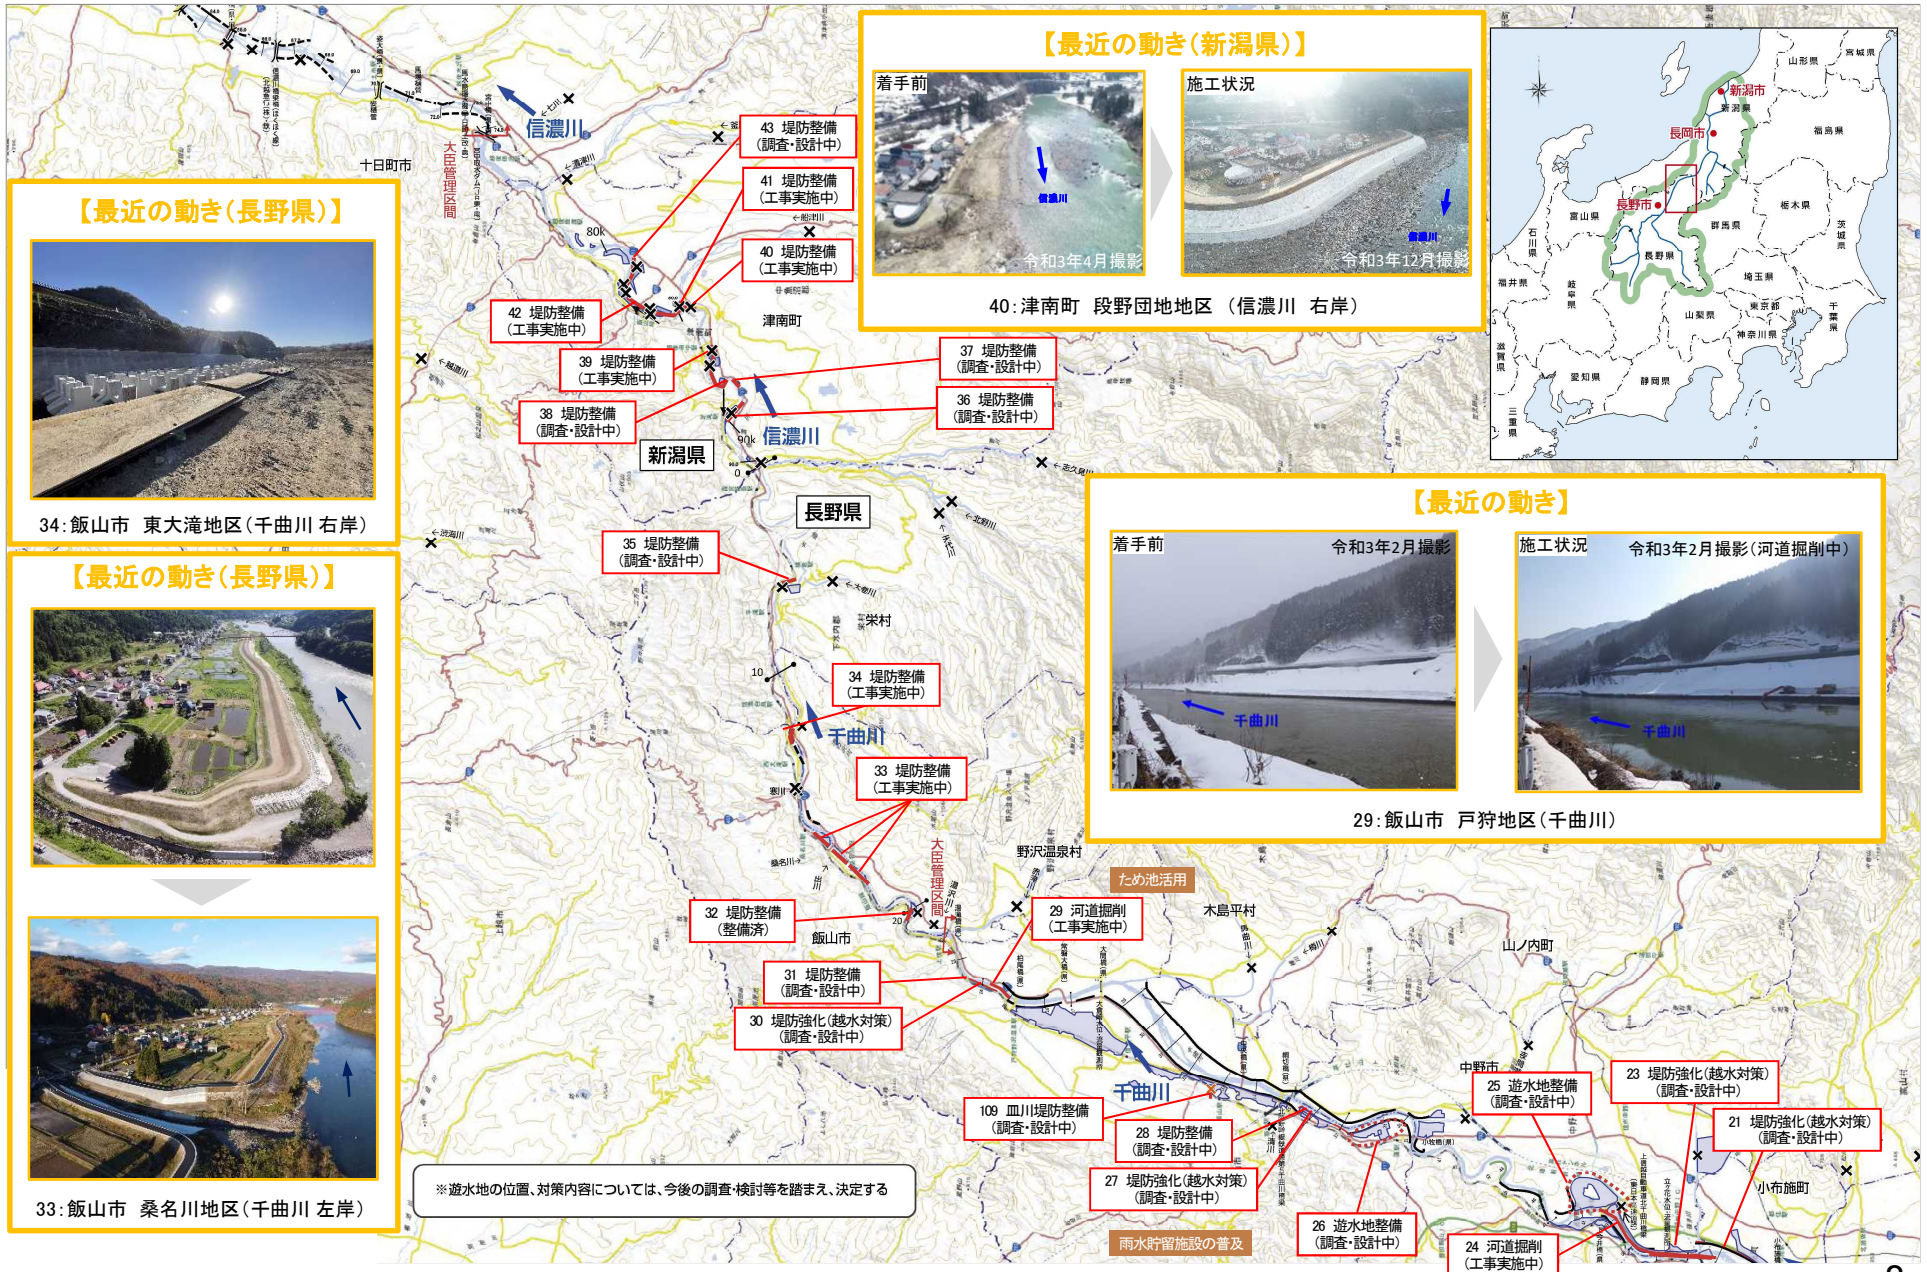

【最近の動き】



48: 小千谷市 塩殿地区 (信濃川 左岸)

流域における対策

- ため池等既存施設の補強や有効活用
- 田んぼダムを活用した雨水貯留機能の確保
- 学校グラウンドなどを活用した雨水貯留施設
- 排水機場等の整備、耐水化の取組
- 防災拠点等の整備


田んぼダム等の雨水貯留活用

排水機場整備

【最近の動き(新潟県)】



42: 津南町 巻下・小島・押付地区 (信濃川 左岸)

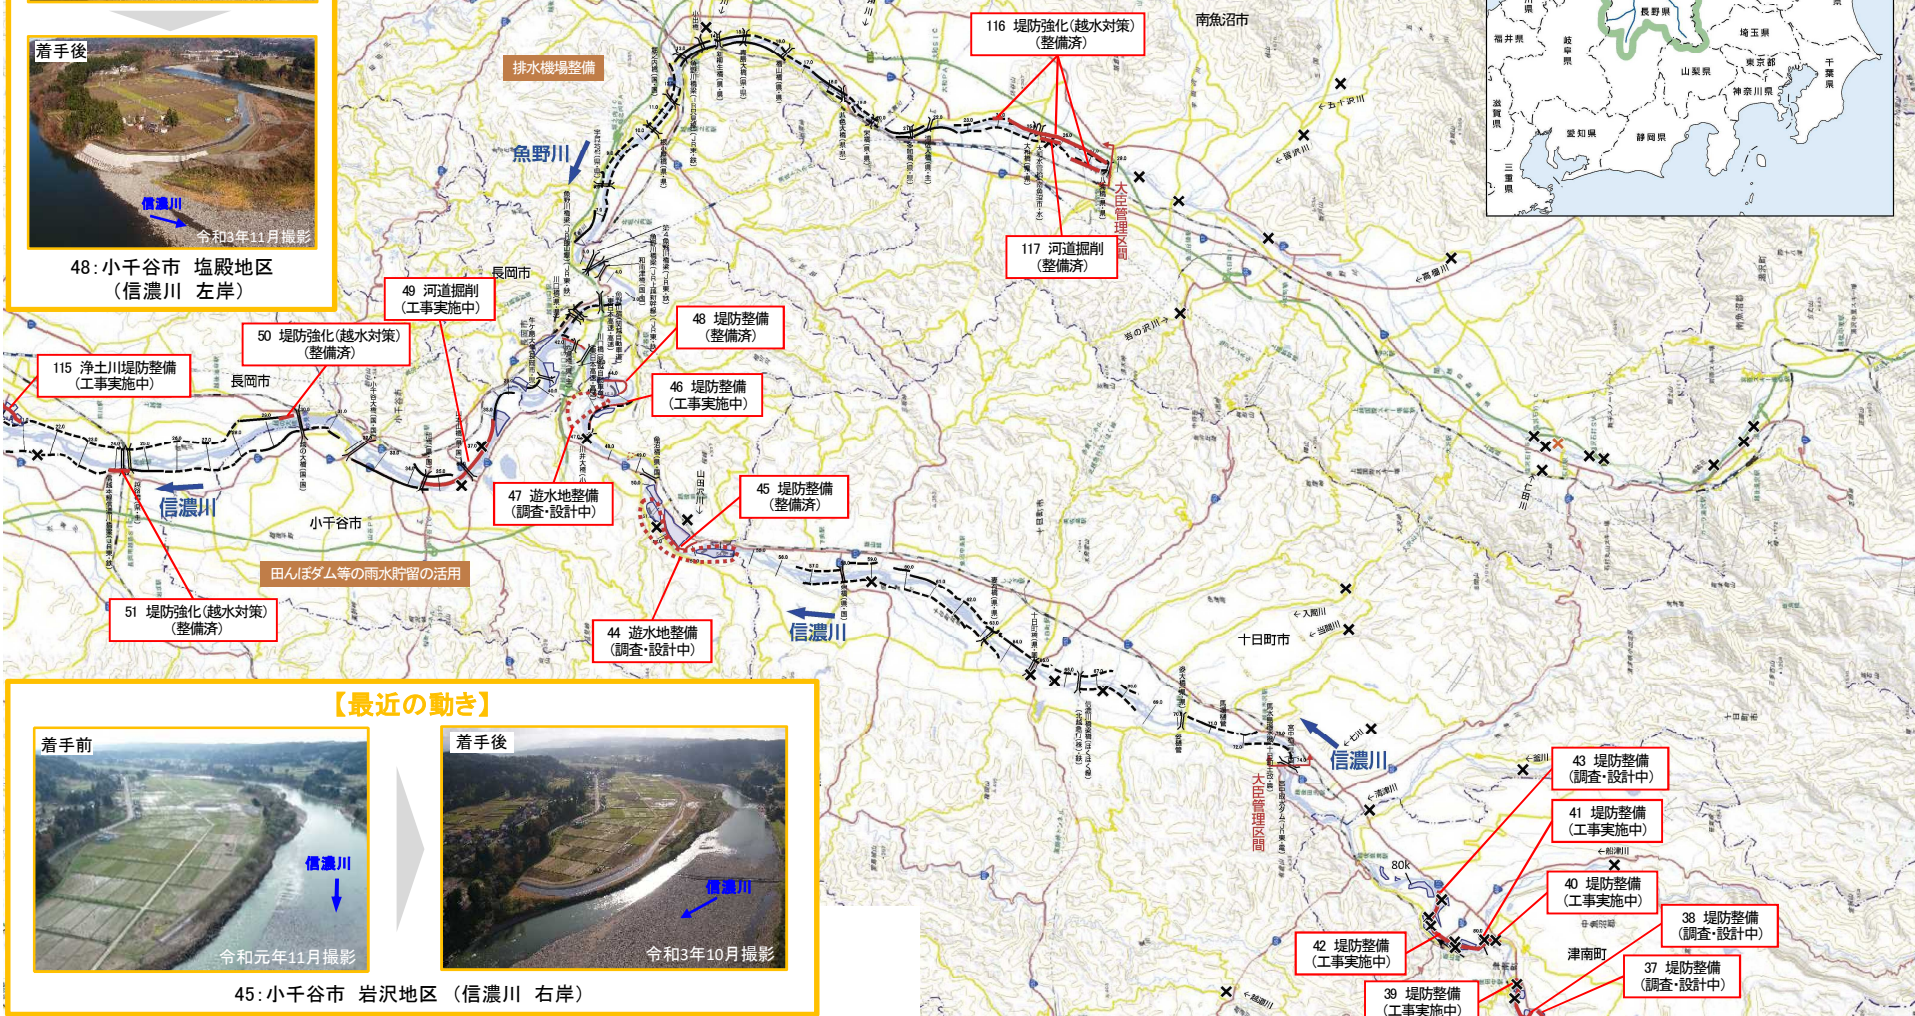

【最近の動き】



45: 小千谷市 岩沢地区 (信濃川 右岸)

【最近の動き】



53:長岡市 楨下地区 (信濃川)
令和3年5月撮影

【最近の動き(新潟県)】



115:長岡市 今井地区 (浄土川)
令和元年4月撮影

