埴生遊水地　これまでの動き

埴生遊水地の整備は、令和２年１２月に地権者の皆様方を対象とした説明会を開催以降、地元の皆様方、地権者の皆様方のご理解とご協力の下、令和５年５月に起工式を開催して、遊水地の工事に着手し、現在に至っています。

引き続き１日も早い洪水に対する安全性向上を目指して、地元千曲市と連携しながら関係者が一丸となって取り組んでまいります。

R2. 12　地権者説明会
（計画案提示･現地調査説明）
R3.　3　地権者説明会
（背割堤説明）
R3. 11　地権者説明会
（用地買収方式の説明）
R4.　4　地権者説明会・意見交換会
R4.　7　地元説明会
R4. 11　地元説明会
R4. 12　用地買収着手
R5.　5　起工式
排水樋門工事着手
背割堤工事着手
R6.　8　地権者説明会
（堤外地）
R6. 10　排水樋門　完成

※埴生遊水地の事業完了までの見通しについては、現在、工程を精査中であり、検討が完了次第お知らせします。

R2. 12. 23地権者説明会

R3. 11. 15地権者説明会

R4. 4. 7意見交換会

R4. 4. 28地権者説明会

R4. 7. 25地元説明会

R4. 11. 24地権者説明会

R5. 5. 25　起工式

R6. 8. 22堤外地説明会

「埴生遊水地整備」　担当職員の紹介

今年度、埴生遊水地整備を担当する職員を紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。

●遊水地事業全般

千曲川緊急治水対策
出張所　所長　丸山

千曲川河川事務所
建設専門官　鴨井

千曲川河川事務所
流域治水課　技官　宇都宮

●工事担当

戸倉出張所
所長　三戸部

戸倉出張所
管理第二係長　寺井

お問い合わせ先

●事業全般に関すること　千曲川河川事務所流域治水課　電話　026-227-9434
●工事に関すること　戸倉出張所　電話　026-275-0133

回　覧

令和７年６月号（No. １）
国土交通省北陸地方整備局
千 曲 川 河 川 事 務 所

埴生遊水地だより発行にあたって

地域の皆様方におかれましては日頃より千曲川河川事務所の治水事業についてご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

現在千曲川河川事務所では、関係自治体等と連携し、令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した千曲市内を含む千曲川沿川において「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」による堤防の整備や河道掘削、遊水地の整備を進めています。

この度、千曲市内で現在整備を進めている「埴生遊水地」について、遊水地整備の目的や効果、工事実施状況を盛り込んだ「埴生遊水地だより」を発行させていただくこととなりました。

今後とも、地域の皆様方へわかりやすく、遊水地に関する最新情報を発信させていただきたいと考えておりますので、引き続き、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

埴生遊水地の整備内容と整備状況

●埴生遊水地は、千曲市中地区の千曲川本川と支川東林坊川の間の範囲を遊水地として整備することで洪水を一時的に貯留し、洪水時の水位低下を図ることを目的とした施設です。

●埴生遊水地には、洪水を遊水地に流入させるための「越流堤（えつりゅうてい）」、遊水地内の堤防のうち千曲川側に設ける「囲繞堤（いぎょうてい）」、住宅側に設ける「周囲堤（しゅういてい）」、一時的に貯留した洪水を洪水のピーク後に千曲川に排水する「排水樋門（はいすいひもん）」、千曲川と東林坊川を隔て、千曲川が洪水時における東林坊川への水位上昇の影響を低減させる「背割堤（せわりてい）」から構成され、これまでに「排水樋門」及び「背割堤」整備に先立っての東林坊川の付替の一部が完成しました。現在、令和６年から始まった「背割堤」工事を実施中で、令和７年度は「周囲堤」工事に着手します。

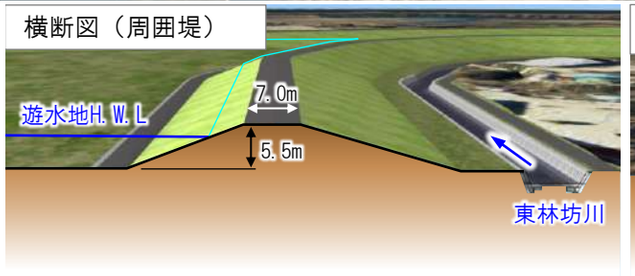

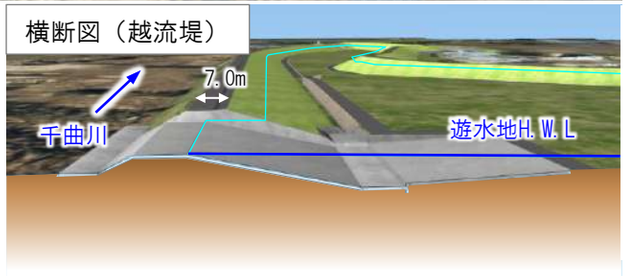

令和7年6月時点

埴生遊水地　工事の実施状況

①
埴生遊水地背割堤工事
川中島建設(株)

東林坊川・千曲川の下流側からの全景です。
背割堤の盛土を進めています。

②
埴生遊水地背割堤工事
川中島建設(株)

付け替えた東林坊川の両岸に侵食を防ぐための
石入りのかご（鉄製）を設置しました

③
埴生遊水地背割堤工事
川中島建設(株)

東林坊川の付け替えの一部が令和7年1月中旬に完了しました。

令和７年度の工事箇所※

- **背割堤工事（令和６年度より継続中）**
- **周囲堤工事及び東林坊川付替工事**

（令和７年度より工事実施予定）

※工事予定は現時点の想定であり、今後の現地状況等により変更となる場合があります。

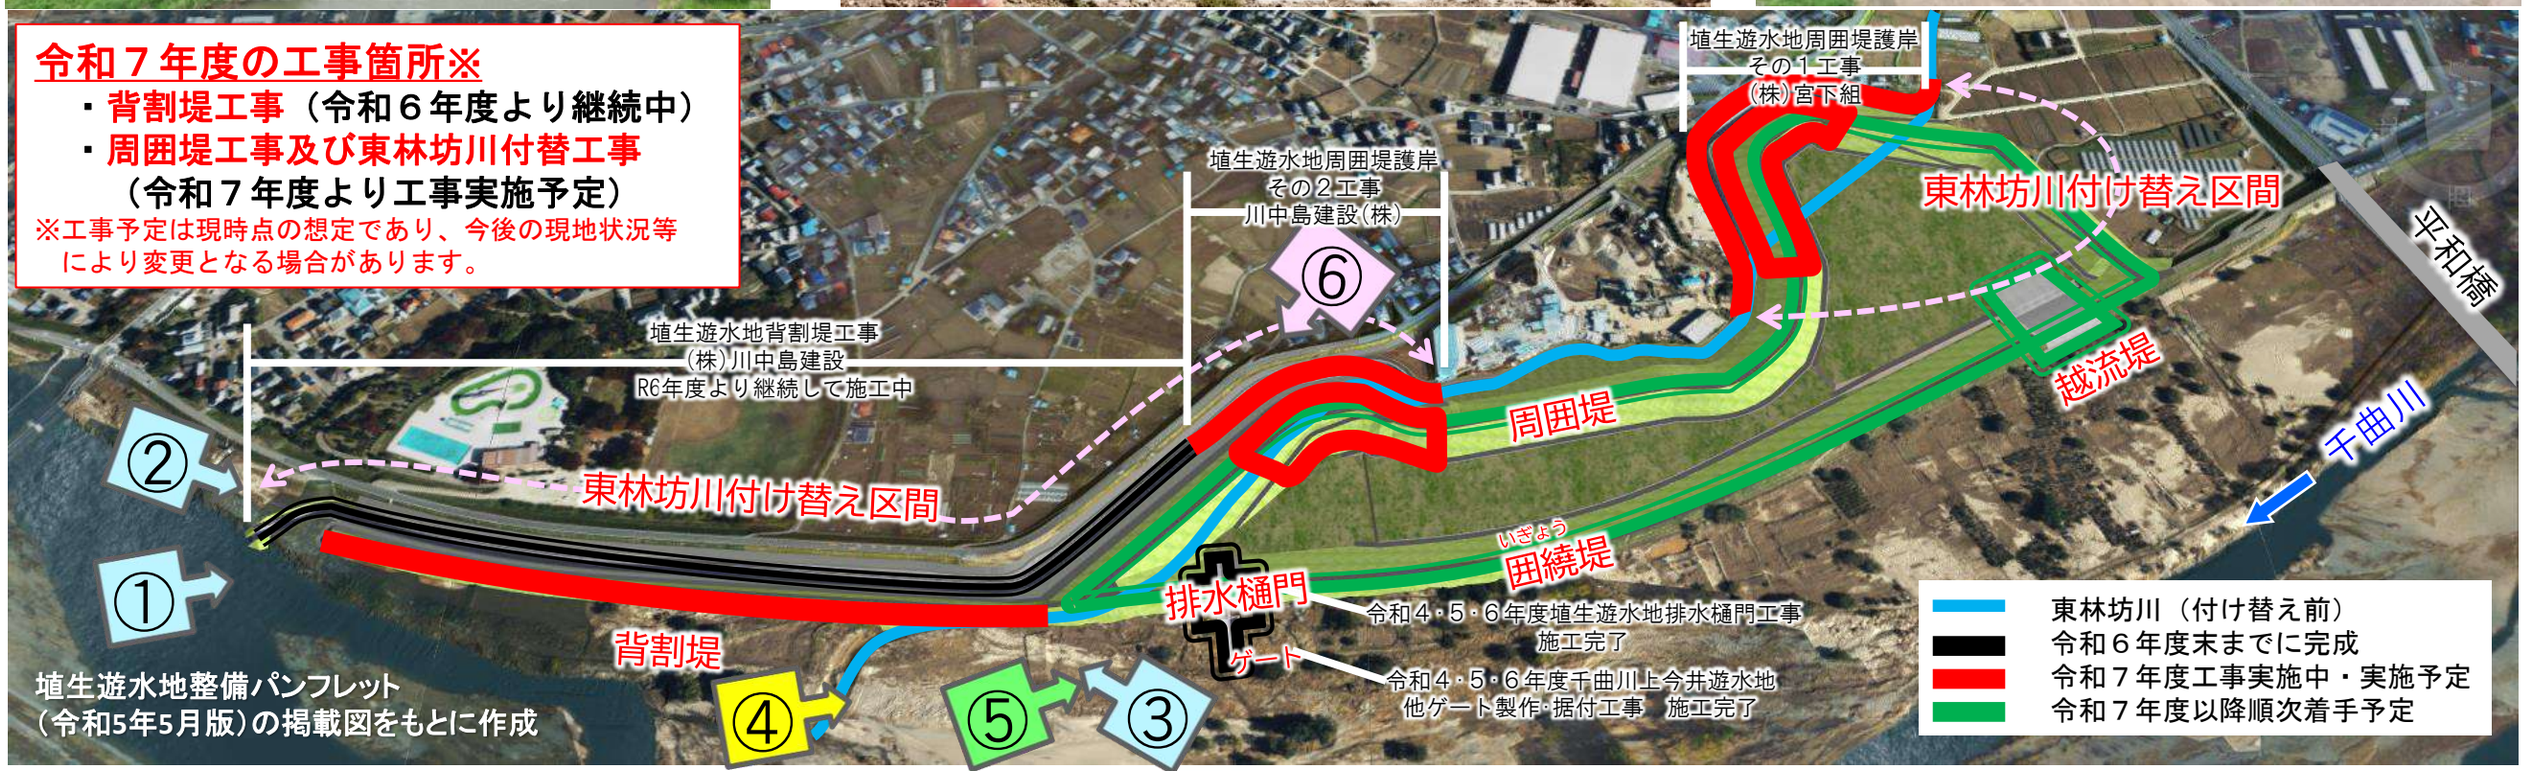

埴生遊水地整備パンフレット
（令和5年5月版）の掲載図をもとに作成

④
令和６年度中地区河道整正工事
株式会社フクザワコーポレーション

遊水地の整備に併せて、河川内の土砂を掘削し、
川の断面積を広げる工事を段階的に進めています。
これにより洪水時の水位を低下させます。

⑤
令和４・５・６年度千曲川上今井遊水地他ゲート製作・据付工事　飯田鉄工(株)

遊水地の完成後、貯留した洪水を遊水地から
この樋門を経て千曲川へ排水します。

排水樋門のゲート(1.3m×3.0m１門)の製作・据付が完了しました。

⑥
令和４・５・６年度埴生遊水地排水樋門工事
中信建設(株)

令和６年１２月に排水樋門の整備が完成しました。
（住宅側から千曲川方向を望む）
