資料－２

信濃川水系（千曲川）緊急治水対策プロジェクト
平和橋遊水地整備　工事説明資料

日頃より、国土交通省の河川事業にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。このたび、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの一環として千曲市八幡地先において「平和橋遊水地整備工事」を行うことになりました。
地元及び堤防道路を利用される方々や関係者の皆様には、何かとご不便をおかけいたしますが、安全第一にて早期の工事完成を目指しますので、ご理解とご協力をお願いたします。

【工事概要】

□工事名　：平和橋遊水地排水樋門及び周囲堤工事　（株）フクザワコーポレーション

：平和橋遊水地周囲堤その1他工事　藤森建設工業（株）

□工事場所　：長野県千曲市八幡地先

□工事期間　：工程表の予定です
※工事期間は延長となる場合があります。

工事時間は8:00～17:00を予定しています。
※原則、土日及び祝日は休工とします。

□工事内容　：【平和橋遊水地排水樋門及び周囲堤工事】
遊水地内掘削 1式、遊水地周囲堤設置 1式、護岸工 1式、樋門本体工 1式、
樋門堤外水路工 1式、仮設工 1式

：【平和橋遊水地周囲堤その1他工事】
遊水地内掘削 1式、遊水地周囲堤設置 1式、仮設工 1式

□発注者　：国土交通省　千曲川河川事務所　戸倉出張所　☎：026-275-0133

□施工者　：株式会社フクザワコーポレーション

（現場代理人）　加藤　優弥　☎：080-2152-5702
（監理技術者）　濵　利樹　☎：080-1389-9857

現場事務所：千曲市大字須坂字下河原646-1（ヤナギハラ産業様の交差点を入った先）


：藤森建設工業株式会社

（現場代理人）　津山　晃　☎：070-2833-6353
（監理技術者）　青木　保　☎：090-1556-3322

現場事務所：千曲市大字八幡字中川原5764-1（サテライト信州千曲様 敷地内）

工事にあたってのお願い
・工事期間中、お気づきの点がございましたら現場職員又は上記担当者まで、ご連絡下さるようお願いいたします。
・工程表については、工事の進捗に伴い、今後変更となる場合があります。

位置図

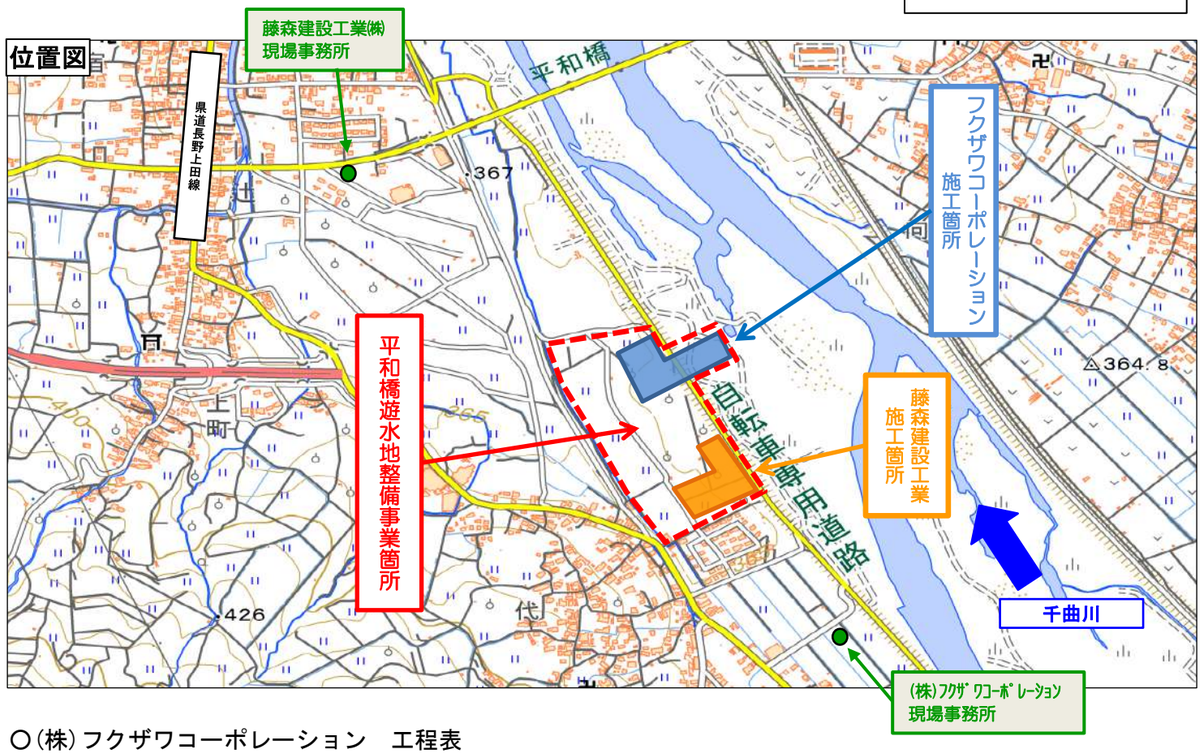

○（株）フクザワコーポレーション　工程表


工種	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月
工事準備（測量等）						
遊水地内掘削						
遊水地周囲堤設置						
護岸工						
樋門本体工						
樋門堤外水路工						
工事用道路工・仮設締切工						

○藤森建設工業（株）　工程表

工　種	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月
工事準備（測量等）						
遊水地内掘削						
遊水地周囲堤設置						
工事用道路工						


※上記は現時点での予定であり、工事の進捗に伴い、今後変更となる場合があります。
尚、建物等に接近する箇所の重機による作業は建物等の事前調査完了後に実施します。

工事の内容

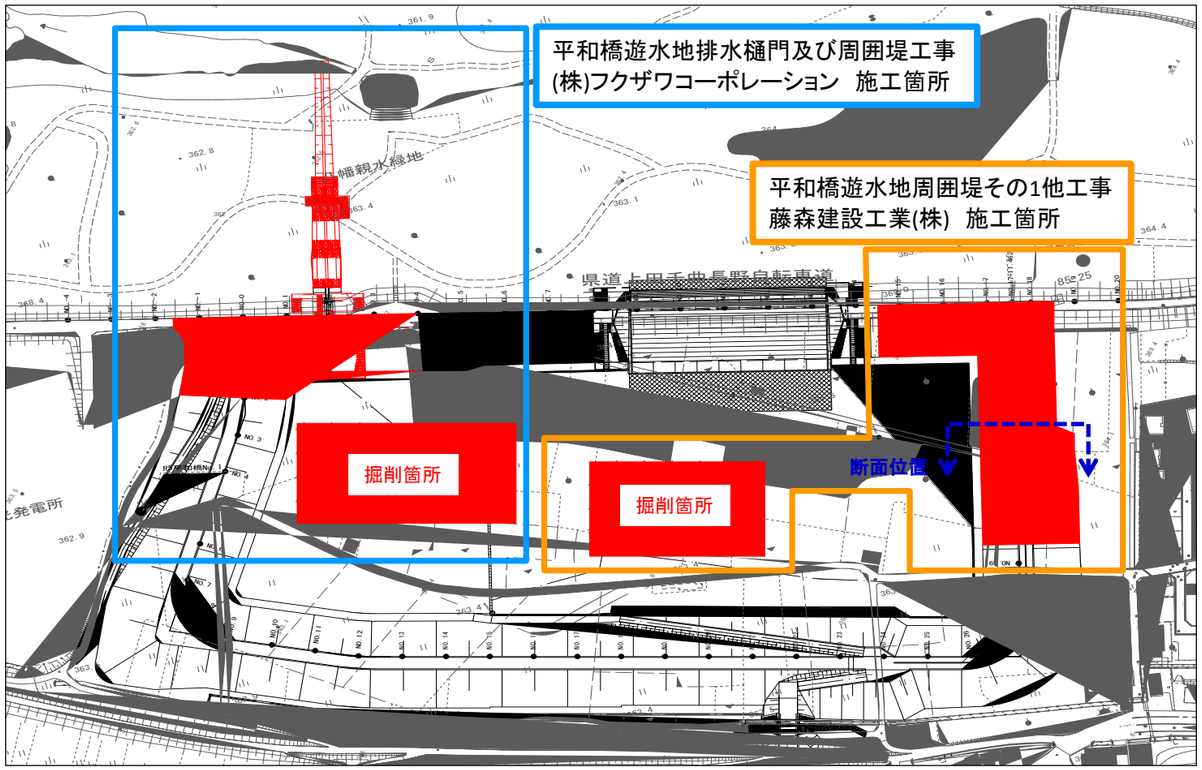


平和橋遊水地周囲堤その1他工事
藤森建設工業(株)

断面図【 周囲堤 】

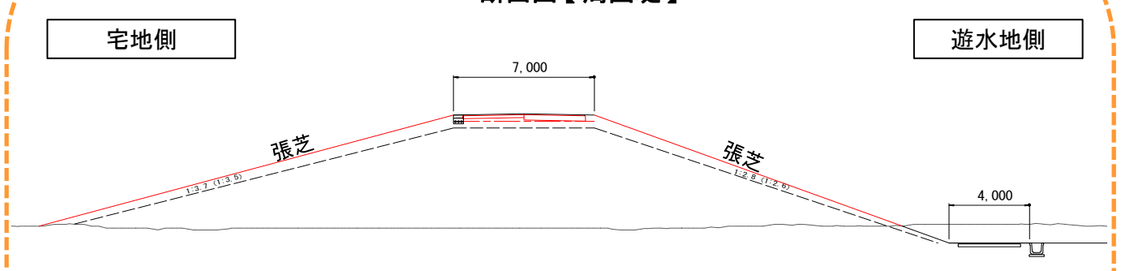

【 施工方法 】


① 良質な土砂を10tダンプトラックにて運搬します。
② ブルドーザーにより土砂を敷き均します。
③ ローラーにより入念に締固めを行います。



※民家に近い場所での作業については、騒音・振動及び
防塵対策を徹底し作業を行います。

平和橋遊水地排水樋門及び周囲堤工事
(株)フクザワコーポレーション

断面図【樋門】

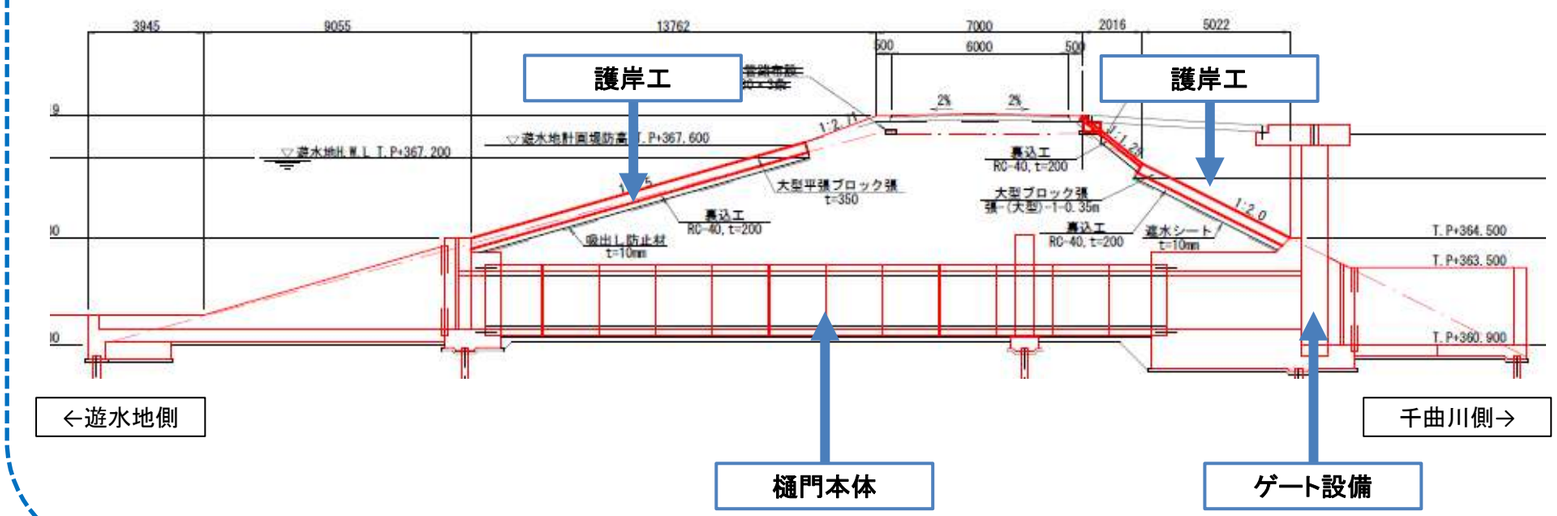


樋門の整備事例
（埴生遊水地排水樋門の完成状況）



工事車両の運行経路

水辺の楽校親水公園　通行・進入禁止区間

※工事期間中の水辺の楽校親水公園の利用可能範囲は時期によって変更となります。詳細については、現地看板にてお知らせします。

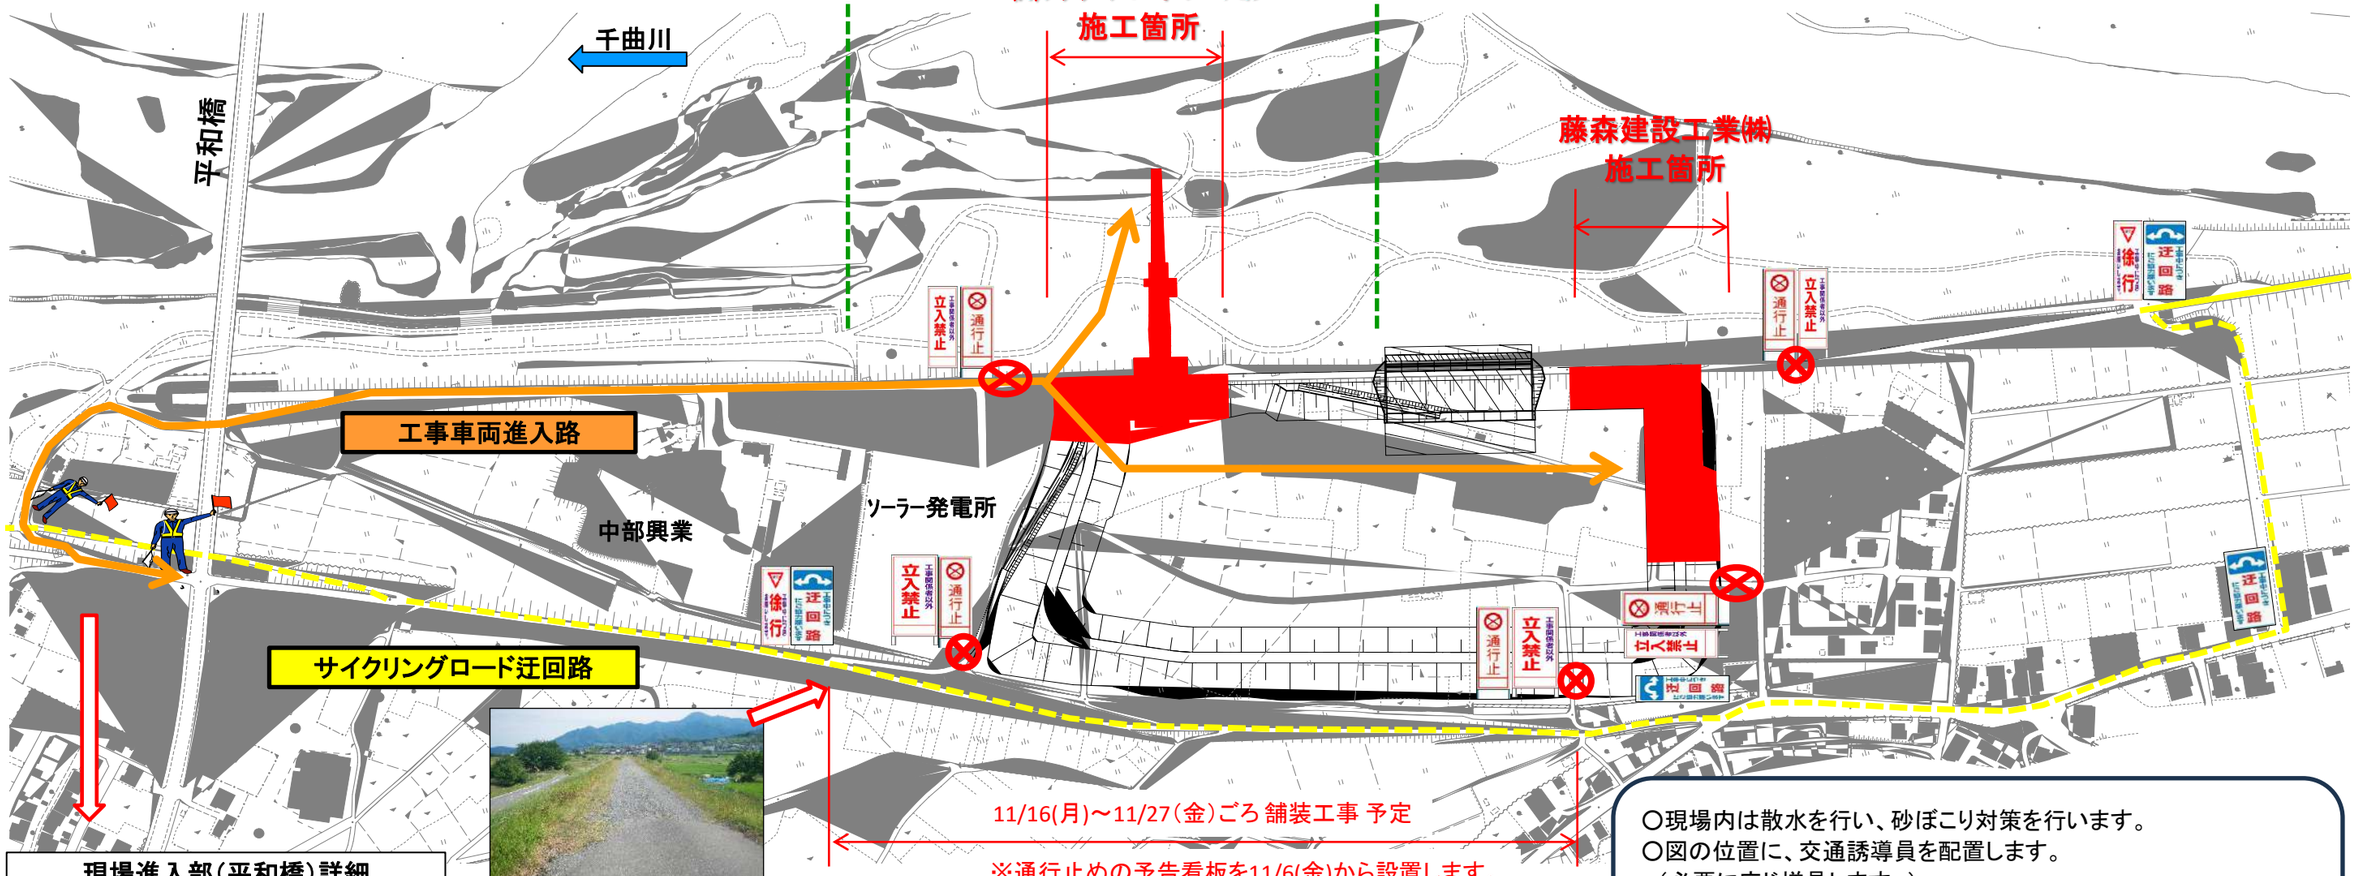

現場進入部（平和橋）詳細



○現場内は散水を行い、砂ぼこり対策を行います。
○図の位置に、交通誘導員を配置します。
（必要に応じ増員します。）
○各所通行止めについては、12月1日（火）からとなります。
（中部興業様、ソーラー発電所までは通行可能です。）
※通行止めの予告看板を11月16日（月）から設置します。

※資材運搬車両ステッカー
・ダンプトラックにはフロント部にステッカーを掲示します。

（株）フクザワコーポレーション

国土交通省
千曲川河川事務所
戸倉出張所

平和橋遊水地排水樋門
及び周囲堤工事

1

㈱フクザワコーポレーション

藤森建設工業（株）

国土交通省
千曲川河川事務所
戸倉出張所

平和橋遊水地周囲堤
その1他工事

1

藤森建設工業㈱
